Datei: MTV München Halle 1 + Fechthalle 190626.PPL Seite 1 von 4

Bauzeitenplan MTV München, Halle 1 + Fechthalle

	,											
Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	

					1 1 1	1 1	1 1	2 2	2 2	2 2	2 2 2	2 2 3 3 9 0	3 3	3 3	3 3	3 3	3 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 5	5 5	5	0 0	4 5	0 7	0 0	1 1	1 1	1 1
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	3 4 5	0 6 /	8 9	0 1	2 3	4 5	6 / 8	3 9 0	1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	1 2	2 1	2 3	4 5	6 /	8 9	0 1	2 3	4 5
1	Torgang	Dauci	Otart	Liide					-		-			-																	
2	Helle 4																														
	Halle 1					Щ																									
3	Sanierungskonzept, Statik - neue Decke	15at	01.04.2019	23.04.2019													Ш				Ш		ш			<u> </u>					
4	Statische Berechnungen, Vorlage für Prüfstatiker	18at	01.04.2019	26.04.2019																											
5	Befundungen - Decken und Wertung	30at	01.04.2019	15.05.2019		-		30at									Ш				Ш					Ш.					
6	Aufzeichnen, Werten, Dokumentieren	5at	13.05.2019	17.05.2019		ш		5at									Ш														
7	Erstellen der Bewehrungspläne	18at	29.04.2019	23.05.2019				1	8at								Ш				Ш		Ш			LL '					
8						Ш																									
9	LBK + Denkmalamt - Freigabe der Deckenerneuerung	30at	08.04.2019	22.05.2019				30	Oat																						
10																															
11	Prüfstatiker - Freigabe der Berechnungen	10at	29.04.2019	13.05.2019				10at																							
12	Prüfstatiker - Freigabe Bewehrungspläne	15at	24.05.2019	17.06.2019						15a	at																				
13																															
14	Vorstellung der Untersuchungsergebnisse bei weiteren Decken durch Fr.Dr.Schießl	1at	21.05.2019	21.05.2019				1 1a	ıt																						
15																															
16	Genehmigungsplanung - Halle 1 neue Decke	5at	22.05.2019	28.05.2019					5at								Ш														
17	Genehmigung - Halle 1 neue Decke durch LBK	25at	29.05.2019	05.07.2019							25	5at																			
18																															
19	Klärung Prallwände u. Glastrennwand in Halle 1 ja/nein, Entscheidung durch Bauherrschaft	5at	24.06.2019	28.06.2019							5at																				
20																															
21	Werkplanung zur Ausführung Halle 1 - neue Decke, Linierung, Bodenhülsen, inkl. Statische Maßnahmen	22at	27.05.2019	28.06.2019							22at						Ш														
22	Sanierungskonzept - Galerie Halle 1	5at	27.06.2019	03.07.2019							5at	t					Ш														
23	Werkplanung - Fechthallenboden, Akustikmaßnahmen, etc.	15at	17.06.2019	08.07.2019							1	15at																			
24																															
25	Beprobung - Fechthallenboden auf KMF	9at	17.06.2019	28.06.2019							9at																				
26	Kurz-LV - KMF Sanierung Fechthalle - Boden/Wand	1at	01.07.2019	01.07.2019							1at																				
27	Angebotseinholung - KMF-Sanierung Fechthalle	12at	02.07.2019	17.07.2019								12at																			
28	Vergabe KMF-Sanierung Fechthalle	2at										2at																			
29																															
30	Veröffentlichung: Geräteraumboden, Prallwände, Geräteraumtore, Glastrennwand, Fechthallenboden, Sporthallenboden inkl. 7 Tage Wartefrist vor Versand	7at	02.07.2019	10.07.2019								7at																			
31																															
32	Leistungsverzeichnis - Halle 1 Decke erstellen	8at	01.07.2019	10.07.2019								8at																			
33	Leistungsverzeichnis - Halle 1 Decke, Versand und Submission	15at	10.07.2019	30.07.2019									15at																		
Droiol-t-	reitrahmen von 02 04 2018 his 24 04 2020	1								1															le:		architek	ton.	et 31		

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 24.04.2020
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 26.06.2019 15:24

Filter: Bearbeiter:

Projektnummer:

Datei: MTV München Halle 1 + Fechthalle 190626.PPL

Seite 2 von 4

Bauzeitenplan

Bauzeitenplan MTV München, Halle 1 + Fechthalle

				Apr 201	9 M	ai 2019	9 .1	un 20	019	Jul 20	19	Διια	2019	Se	n 2010	9 0	kt 20	19	Nov	2019	D ₄	₂₇ 20	19	Jan	2020	Fe	h 20	20 M	lrz 20	20	
																															1
Vorgang	Dauer	Start E		3 4 5 6	7 8	9 0 1	2 3	3 4	5 6	7 8 9	9 0	1 2	3 4 5	5 6	7 8	9 0	1 2	3 4	5 6	5 7	8 9	0 1	2	1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	1 2	2 3	4
	7at								-			7:	at																		
Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, erstellen	5at	08.07.2019	12.07.2019							5 a	at																				
Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, Versand und Submission	10at	15.07.2019	26.07.2019					П			1	0at												П							
Boden Fechthalle - LV- Wertung und Vergabe	5at	29.07.2019	02.08.2019									5at																			
																								П							П
Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, erstellen - inkl. Geräteraumböden	5at	08.07.2019	12.07.2019							5 a	at													П							
Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, Versand und Submission - inkl. Geräteraumböden	10at	15.07.2019	26.07.2019								1	0at																			
Böden Halle 1 - LV-Wertung und Vergabe - inkl. Geräteraumböden	5at	29.07.2019	02.08.2019									5at												П							
																															П
Geräteraumtore, Glaswand, Prallwände - LV-Erstellen	12at	15.07.2019	30.07.2019									12at																			
Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Versand-LV mit Submission	15at	01.08.2019	22.08.2019										15	ōat																	
Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Vergabe zur Bauausführung	5at	26.08.2019	30.08.2019											5at																	
																								П							П
Bauausführung - Halle 1 - betroffen sind dabei: Flure, Fechthalle, Umkleiden																															
Fechthalle - Schadstoffsanierung																															
KMF Sanierung Wandfläche	8at	29.07.2019	07.08.2019									8a	t																		
KMF Sanierung mit Rückbau Fechthallenboden mit Technik	8at	31.07.2019	09.08.2019									8	at																		
Baumeister																															
Sanierungsarbeiten Halle 1, alle Bereiche																															Ш
Baustelleneinrichtung - Galerie OG Halle 1	10at	15.07.2019	26.07.2019																												
Galerieuntersichten Betonsanierung	14at	29.07.2019	16.08.2019										14at																		
Herrenumkleide - statische Deckenabsicherung und Baustelleneinrichtung	10at	19.08.2019	30.08.2019											10a	t																
Herrenumkleide - Fundamente + Deckenabbruch	10at	28.08.2019	10.09.2019												10at																
Herrenumkleide - neue Decke, UZ, Stützen + Bodenhülsen	10at	11.09.2019	24.09.2019													10at															
Herrenumkleide - Absicherung + Baustelleneinrichtung rückbauen	8kt	23.09.2019	30.09.2019													8	ct .														
																														П	
																					- 11								- 1	_	
Abschnitt 1 - Fechthalle - Abbruchbühne einbauen	5at	19.08.2019	23.08.2019										5	at																	
	Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, Versand und Submission Boden Fechthalle - LV- Wertung und Vergabe Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, erstellen - inkl. Geräteraumböden Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, Versand und Submission - inkl. Geräteraumböden Böden Halle 1 - LV-Wertung und Vergabe - inkl. Geräteraumböden Geräteraumböden, Prallwände, Glastrennwand - Versand-LV mit Submission Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Vergabe zur Bauausführung Bauausführung - Halle 1 - betroffen sind dabei: Flure, Fechthalle, Umkleiden Fechthalle - Schadstoffsanierung KMF Sanierung Wandfläche KMF Sanierung mit Rückbau Fechthallenboden mit Technik Baumeister Sanierungsarbeiten Halle 1, alle Bereiche Baustelleneinrichtung - Galerie OG Halle 1 Galerieuntersichten Betonsanierung Herrenumkleide - statische Deckenabsicherung und Baustelleneinrichtung Herrenumkleide - Fundamente + Deckenabbruch Herrenumkleide - Pendemente + Deckenabbruch Herrenumkleide - Absicherung + Baustelleneinrichtung	Leistungsverzeichnis - Halle 1 - Wertung u. Vergabe Tat Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, erstellen Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, Versand und Submission Boden Fechthalle - LV- Wertung und Vergabe 5at Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, erstellen - inkl. Geräteraumböden Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, Versand und Submission - inkl. Geräteraumböden Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, Versand und Submission - inkl. Geräteraumböden Böden Halle 1 - LV-Wertung und Vergabe - inkl. Geräteraumböden Geräteraumböden Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Versand-LV mit Submission Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Vergabe zur Bauausführung Bauausführung - Halle 1 - betroffen sind dabei: Flure, Fechthalle, Umkleiden Fechthalle - Schadstoffsanierung KMF Sanierung Wandfläche Rat KMF Sanierung mit Rückbau Fechthallenboden mit Technik Baumeister Sanierungsarbeiten Halle 1, alle Bereiche Baustelleneinrichtung - Galerie OG Halle 1 Galerieuntersichten Betonsanierung 10at Herrenumkleide - statische Deckenabsicherung und Baustelleneinrichtung Herrenumkleide - Fundamente + Deckenabbruch Herrenumkleide - neue Decke, UZ, Stützen + Bodenhülsen 10at Herrenumkleide - Absicherung + Baustelleneinrichtung	Leistungsverzeichnis - Halle 1 - Wertung u. Vergabe Tat 01.08.2019 Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, erstellen 5at 08.07.2019 Leistungsverzeichnis - Boden Fechthalle, Versand und 10at 15.07.2019 Boden Fechthalle - LV- Wertung und Vergabe 5at 29.07.2019 Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, erstellen - inkl. 5at 08.07.2019 Leistungsverzeichnis - Böden Halle 1, versand und Submission - inkl. Geräteraumböden 10at 15.07.2019 Böden Halle 1 - LV- Wertung und Vergabe - inkl. 5at 29.07.2019 Böden Halle 1 - LV- Wertung und Vergabe - inkl. 5at 29.07.2019 Geräteraumböden Prallwände, Glastrennwand - 15at 01.08.2019 Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - 15at 01.08.2019 Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - 5at 26.08.2019 Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - 5at 26.08.2019 Bauausführung - Halle 1 - betroffen sind dabei: Flure, Fechthalle, Umkleiden 8at 29.07.2019 KMF Sanierung Wandfläche 8at 29.07.2019 KMF Sanierung mit Rückbau Fechthallenboden mit Technik 8at 31.07.2019 Baumeister Sanierung mit Rückbau Fechthallenboden mit Technik 8at 31.07.2019 Galerieuntersichten Betonsanierung 14at 29.07.2019 Herrenumkleide - statische Deckenabsicherung und Baustelleneinrichtung 10at 19.08.2019 Herrenumkleide - Fundamente + Deckenabbruch 10at 28.08.2019 Herrenumkleide - Fundamente + Deckenabbruch 10at 11.09.2019 Herrenumkleide - Russicherung + Baustelleneinrichtung 10at 11.09.2019 Herrenumkleide - Absicherung + Baustelleneinrichtung 10at 11.09.2019	Vorgang	Vorgang	Norgang	Norgang	Norgang	Norgang	Vorgang	Norgang	Vorgang	Apr 2019 Mai 2019 Jul 2019 Aug Vorgang	Apr 2019 Mai 2019 Jul 2019 Jul 2019 Aug 2019 Vorgang	Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Set	Vorgang	Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 O y o gang Sep 2019 O y o gang	Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Okt 20	Vorgang	Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019	Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Vorgang Daver Start Ende Start Ende Start Star	May 2019 May 2019	Apr 2019 Max 2019 Jun 2019 Jun 2019 Jun 2019 Rug 2019 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Oke 2019	Vargang Dawr Ende	Vorgang Daier Stort St	Note Property Pr	May 2019 May 2019	Part Part	Note Part Part	Note Part Part	March Marc

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 24.04.2020


Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 26.06.2019 15:24

Filter:

Bearbeiter:

Projektnummer:

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

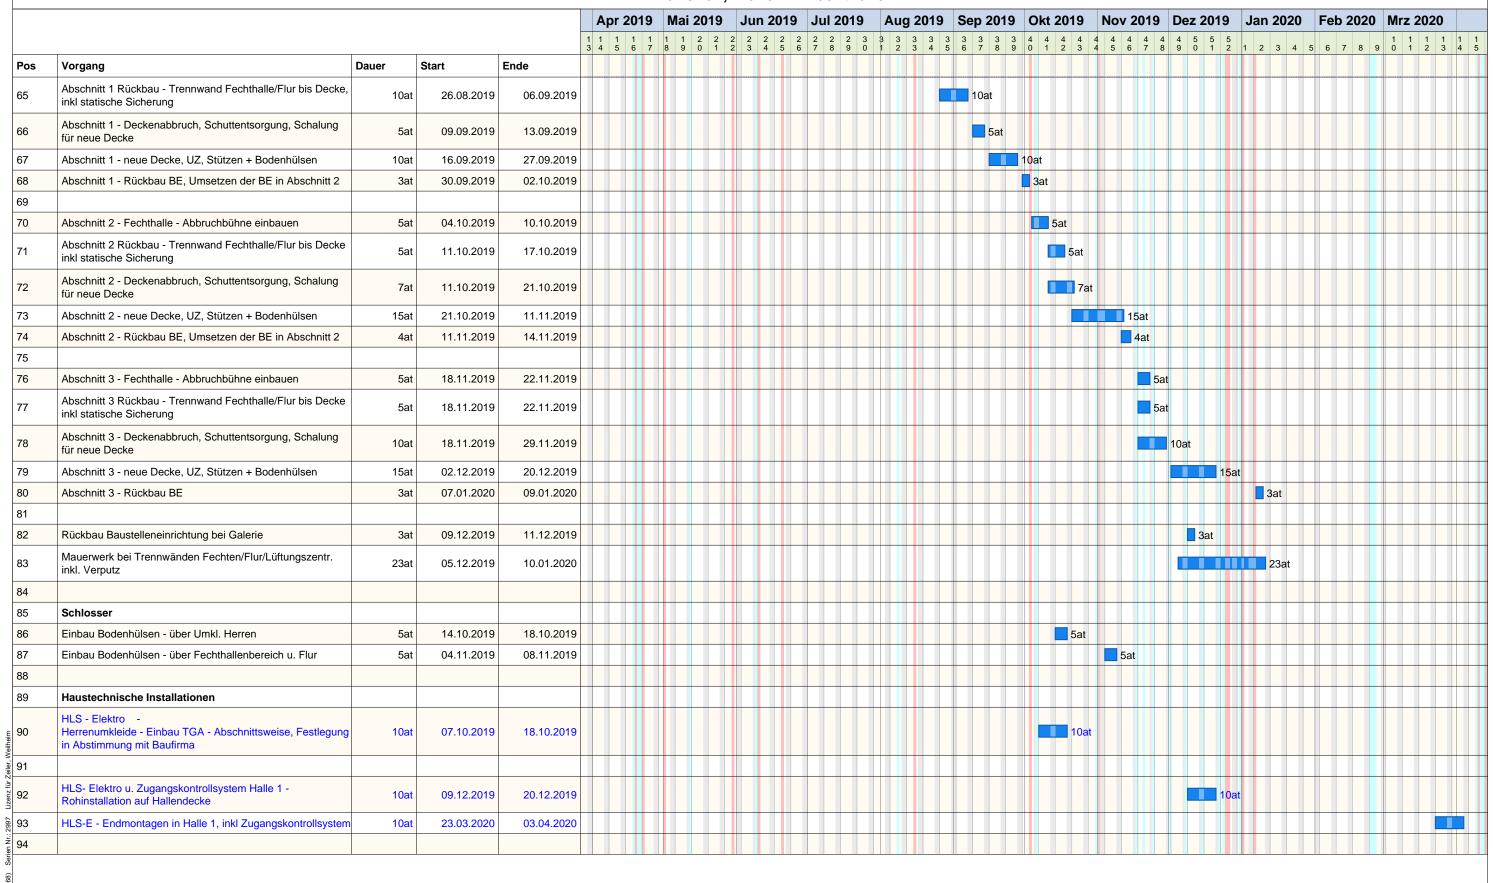

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 24.04.2020

Kalender: Bayern (eingebettet) Druckdatum: 26.06.2019 15:24

Filter:

Bearbeiter:

Projektnummer:

Datei: MTV München Halle 1 + Fechthalle 190626.PPL Bauzeitenplan Seite 4 von 4 Projektnummer:

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

					Apr	2019	Ma	i 201	9 J	un 20)19	Jul 20	019	Aug	2019	Se	ep 2019	9 0	kt 201	9	Nov 2	2019	Dez	z 2019	J	an 202	0 F	Feb 2	020	/lrz 20)20	
																										2 3 4						1 1 4 5
Pos	Vorgang	Dauer	Start E	Ende						П												Ш			Ш						T	
95	HLS - Elektro - Rohinstallation unter Hallendecke 1, in Fechthalle - Einbau TGA - Abschnittsweise, Festlegung in Abstimmung mit Baufirma	22at	09.12.2019	13.01.2020																						22a	t					
96	HLS - Elektro Fertigmontage Fechthalle u. Technikzentralen, Hallenbeleuchtung - Fechten	10at	13.01.2020	24.01.2020																							10at	t				
97																									П						П	П
98	Ausbau Halle 1																															
99	Metallbauer - Schreiner - Verglasungen - Böden																															
100	Einbau UK - Glastrennwand	8at	02.12.2019	11.12.2019																				8at								
101	Endmontage Glastrennwand	4at	23.03.2020	26.03.2020																												
102																																
103	Geräteraumtüren - Einbau Zargen u. Bodenschienen	8at	02.12.2019	11.12.2019																				8at								
104	Geräteraumtüren - Endmontage	4at	23.03.2020	26.03.2020																												
105																																
106	F90- Bodenanschluss bei Haupteingang Halle 1	5at	02.12.2019	06.12.2019																			5	at	П							
107	Einbau - Fußbodenheizung mit Unterbau	15at	07.01.2020	27.01.2020		Ш																					15	at				
108	Einbau - Sportboden mit Linierung	40at	27.01.2020	20.03.2020																											4	
109	Geräteräume - Unterboden	9at	02.03.2020	12.03.2020																										9a	at	
110	Geräteräume - Oberboden	5at	13.03.2020	19.03.2020																											5at	
111																																
112	Nebenarbeiten - kleine Malerarbeiten, Endmontagen, etc.	10at	23.03.2020	03.04.2020																												
113																																
114	Übergabe - Halle 1 für Sportbetrieb	2at	06.04.2020	07.04.2020																												
115	Ostern 2020 - Hallenfertigstellung - Halle 1																															
116																																
117	Ausbau Fechthalle																															
118	Hallenboden - Unterkonstruktion - Rohinstallation Bodentechnik u. Fechtelektronik	15at	13.01.2020	31.01.2020																							1	15at				
119	Hallenboden - Oberbodenbelag - Endmontage	25at	03.02.2020	06.03.2020																										25at		
120																																
121	Nebenarbeiten an Wänden, Einrichtung, Abnahmen, Mängelbeseitigung, etc.	15at	09.03.2020	27.03.2020																												
122																																
<u>5</u> 123	Übergabe - Fechthalle für Sportbetrieb	2at	30.03.2020	31.03.2020																												
ür Ze.		1																					-11 - 11									

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 24.04.2020

Kalender: Bayern (eingebettet) Druckdatum: 26.06.2019 15:24

Filter: Bearbeiter:
