Bauzeitenplan

MTV München, Liegenschaften - Meilensteinplan

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Häberstraße 11 b**			
2	**Halle 1**			
3	Planung	194at	03.04.2018	11.01.2019
4	Ausführung	55at	07.01.2019	22.03.2019
5				
6	**Öffentliche Toiletten UG**			
7	Planung	43at	14.05.2018	13.07.2018
8	Ausführung	40at	06.08.2018	01.10.2018
9				
10	**Hausmeisterwhg.**			
11	Entwurf, Eingabe/Werkplanung	111at	14.05.2018	19.10.2018
12	Ausschreibung und Vergabe, nach Festlegung Eigenleistung	30at	08.10.2018	19.11.2018
13	Ausführung - nach Baugenehmigung	80at	29.10.2018	21.02.2019
14				
15	**EG-Büro Rückbau u. Umbau**			
16	Entwurf, Eingabe/Werkplanung	120at	14.05.2018	02.11.2018
17	Ausschreibung und Vergabe, nach Festlegung Eigenleistung	25at	22.10.2018	26.11.2018
18	Ausführung - Rückbau u. neuer Empfang	30at	25.02.2019	05.04.2019
19				
20	**DoJo-Halle**			
21	Entwurf, Eingabe/Werkplanung/ Befundung	111at	14.05.2018	19.10.2018
22	Ausschreibung und Vergabe, nach Festlegung Eigenleistung	30at	08.10.2018	19.11.2018
23	Ausführung - nach Baugenehmigung mit Eigenleistung vorab	70at	03.12.2018	13.03.2019
24				
25	**UG- Umkleiden, Wellness, Sauna**			
26	Planung, Ausschreibung	135at	14.05.2018	23.11.2018
27	Angebotsbearbeitung, Submission u- Vergabe	25at	19.11.2018	21.12.2018
28	1.BA Umkleiden - nach Begenehmigung	61at	08.04.2019	09.07.2019
29	2.BA Umkleiden u. Wellness	118at	08.04.2019	27.09.2019
30				
31	**OG- Halle 2**			
32	Planung	95at	24.09.2018	08.02.2019
33	Ausschreibung und Vergabe	35at	28.01.2019	15.03.2019
34	Ausführung	64at	01.07.2019	27.09.2019
35				
36	**Häberlstraße Allgemeine Bereiche**			
37	Planung	95at	15.10.2018	28.02.2019
38	Ausführung	107at	01.07.2019	29.11.2019
39				
40	**Werdenfelsstraße 70**			
41	**Duschen zu Umkleiden 3+4**			
42	Planung, Ausschreibung	20at	18.06.2018	13.07.2018
43	LV-Versand, Bieter und Vergabe	35at	07.01.2019	22.02.2019
44	Ausführung	39at	22.07.2019	13.09.2019
45				
46	**Duschen zu Umkleiden 5+6**			
47	Planung, Ausschreibung	25at	01.10.2018	06.11.2018
48	LV-Versand, Bieter und Vergabe	35at	07.01.2019	22.02.2019
49	Ausführung	39at	22.07.2019	13.09.2019
50				
51	**Nebengebäude/Bauhof**	1kt	30.06.2018	30.06.2018
52	Planung - LPH 1-3 mit Kosten	44at	30.07.2018	28.09.2018
53	Planung - LPH 4-7	56at	01.10.2018	19.12.2018
54	Ausführung	75at	29.04.2019	16.08.2019
55				
56	**Fassadensanierung Turnhalle u. allgemeine Arbeiten Innenbereiche**			
57	Planung	147at	03.04.2018	02.11.2018
58	Ausführung	98at	15.04.2019	06.09.2019

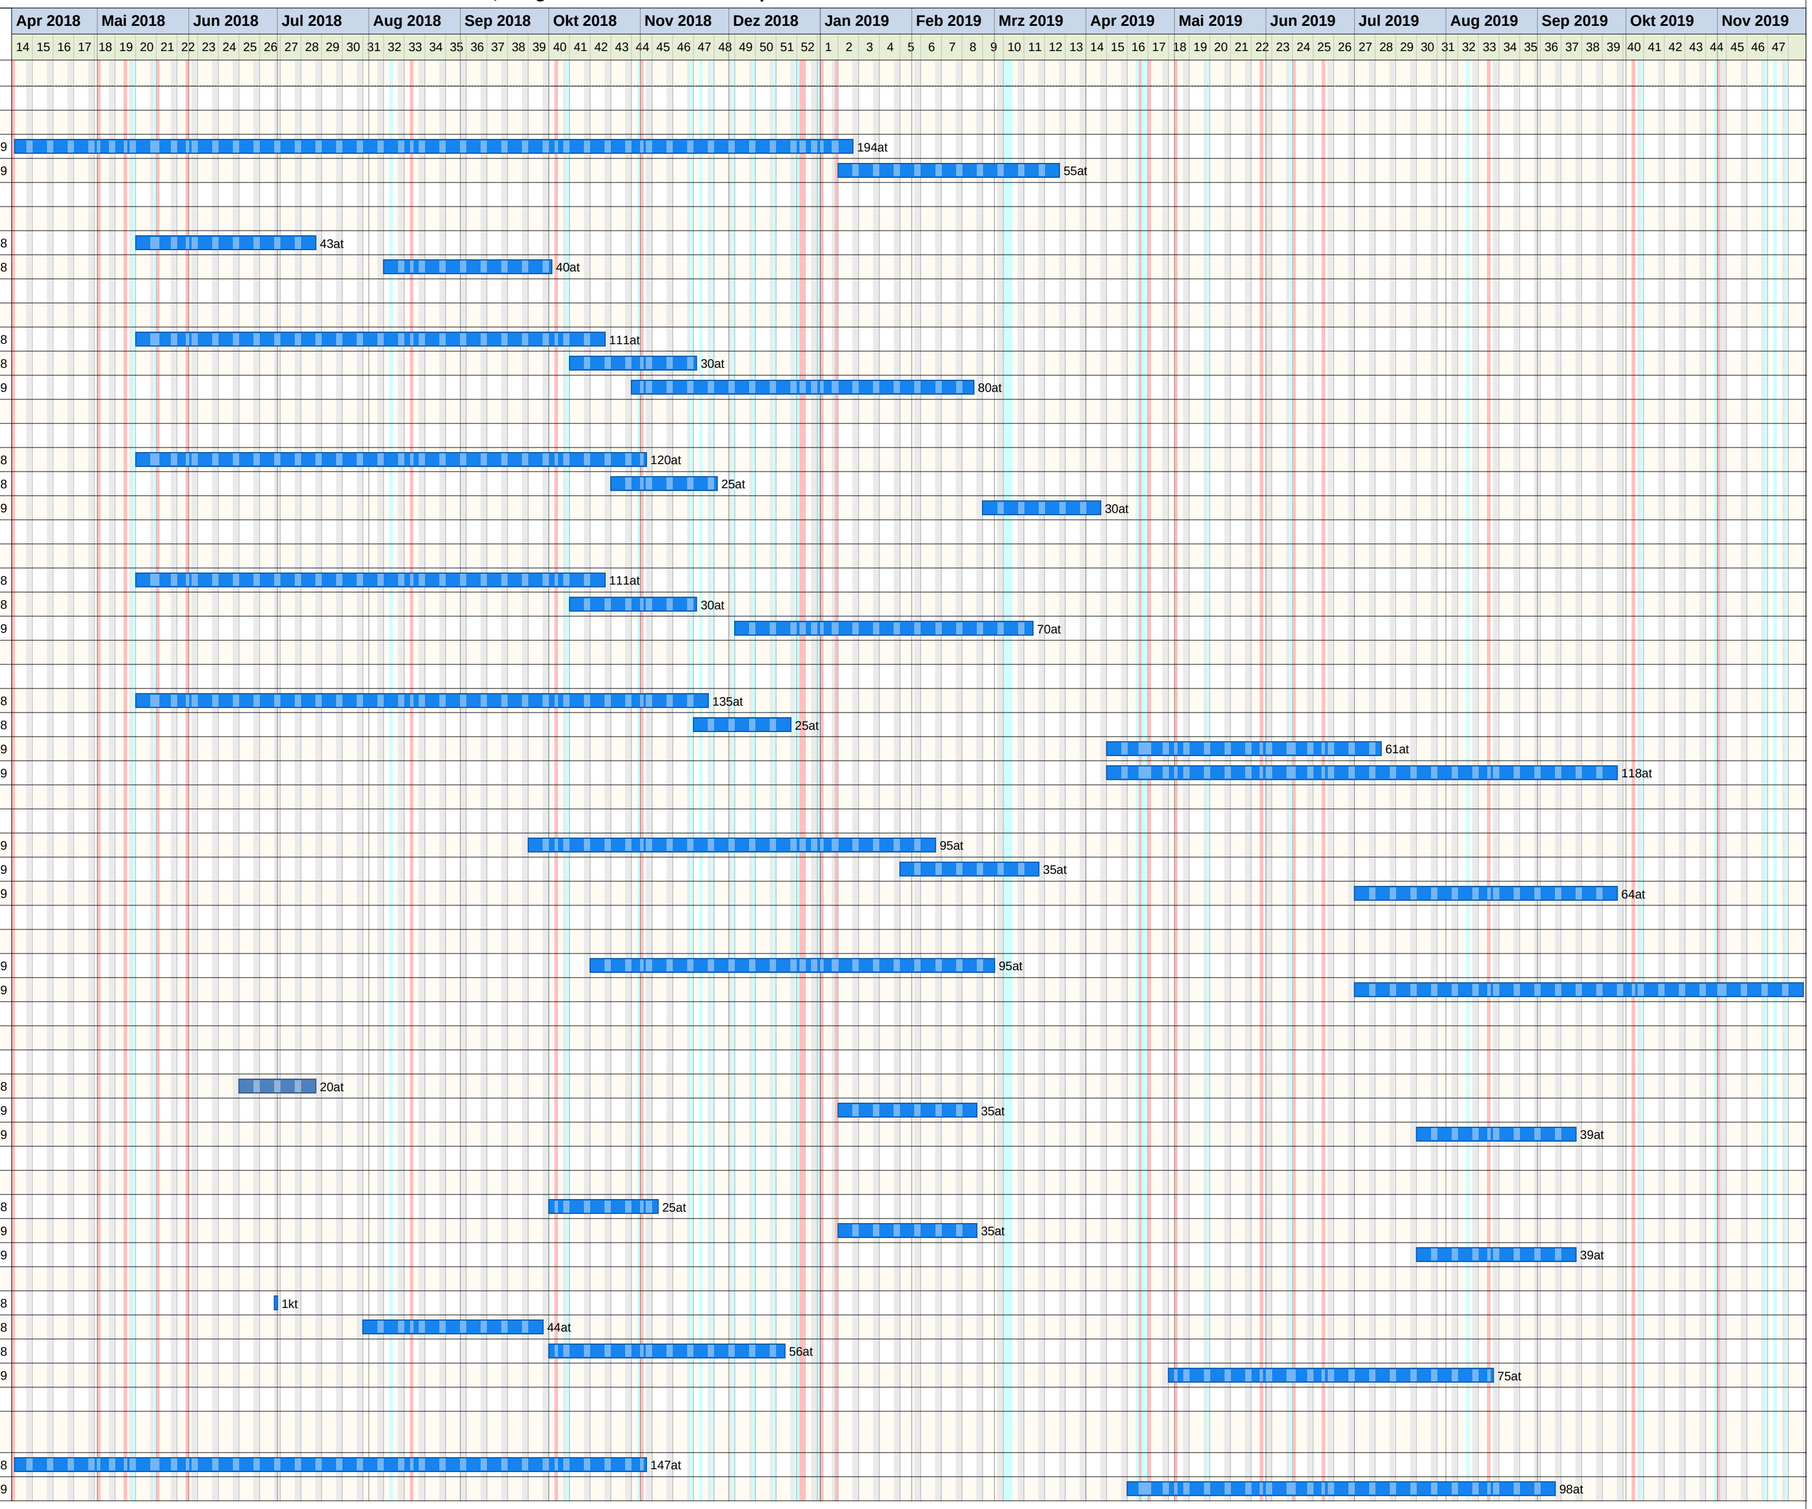

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 30.11.2019
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 12.09.2018 18:54
Filter:
Bearbeiter:

BIOPLAN Architekten
Alpenstraße 3
D-82362 Weilheim
Tel. 0881-901170-0
Fax 0881-901170-99
e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

erstellt mit pro Plan 5 (5.0.1.68) Seriennr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim
